～新たな管理型産業廃棄物最終処分場の整備について～

Vol.33
令和７年４月

県・エコサイクル高知からのお知らせ

工事区域の現在の状況

１　施設本体工事

工事区域を上空から見た状況（令和７年3月13日撮影）

施設本体南側斜面の掘削及び改良土盛土の施工を進めると共に、斜面表面に降った雨水を排水するための排水路を整備しています。

また、処分場建物の建築や防災調整池の施工が始まりました。

【問い合わせ先】

○ 公益財団法人エコサイクル高知 佐川町事務所
電　話：０８８９－２２－４７４４
ＦＡＸ：０８８９－２２－４７６４
メール：info@ecokochi.or.jp
〒789-1201　高岡郡佐川町甲1650番１号

○ 高知県 林業振興・環境部 環境対策課
電　話：０８８－８２１－４５９５
ＦＡＸ：０８８－８２１－４５２０
メール：030801@ken.pref.kochi.lg.jp
〒780-8570 高知市丸ノ内1丁目7番52号

1　施設本体工事

処分場南側斜面では、上から５段目までの掘削及び改良土盛土の施工を行い、３段目までは表面部保護（緑化対策）が完了しました。現在は４段目以降の施工を進めています。

南側斜面の掘削状況（令和７年4月9日撮影）

３段目までの表面部保護状況（令和７年4月14日撮影）

南側斜面頂上部からみた加茂地区方面です。

南側斜面から見た北方面（令和7年４月14日撮影）

防災調整池では堤体のコンクリート打設が始まりました。

防災調整池付近の整備状況（令和7年４月９日撮影）

2　進入路の整備状況

現在は進入路入口付近の山側及び二つ目の函渠（かんきょ）周辺の擁壁工を進めています。（この部分の工事は５月末ごろの完了を予定しています。）

擁壁工及び函渠の整備状況（令和7年４月14日撮影）

国道33号から見た状況（令和7年４月14日撮影）

環境保全等連絡協議会を開催しました

３月23日（日）に、第７回環境保全等連絡協議会を集落活動センター「加茂の里」で開催しました。会議では、エコサイクル高知から説明を行った後、参加者の皆様と意見交換を行いました。

エコサイクル高知の説明内容

・工事の進捗状況について
・令和７年度の工事予定について
・工事中の環境モニタリングの結果等について　等

環境保全等連絡協議会の様子

主なご意見及び回答

Q：処分場工事の上流地点で行った、河川水の浮遊物質量の測定結果が高い数値となっているがどうしてか？
A：他の地点の結果や工事開始前の結果と比べて高い数値ではありません。また、浮遊物質量の結果も通常の変動の範囲内となっています。

Q：大平山鉱床での残土処理は盛土規制法の対象か？
A：盛土規制法施行前に施工しているため、法に基づく届出の手続きのみ行っておりますが、同法の基準を満たす安全な施工を行っていきます。

Q：防災調整池は、進入道路に降った雨についても調整するのか？
A：防災調整池の放流量を調整することで対応しています。

Q：地元小学生を対象とした環境学習を行う予定はあるのか？
A：夏場以降を目途に実施を考えており、経過などは協議会で報告させていただきます。
【佐川町住民課から回答】

Q：国道33号から施設へ進入する右折レーンの設置工事の発注時期はいつか？
A：令和7年度末頃を予定しています。

高知県土木部住宅課からのお知らせ

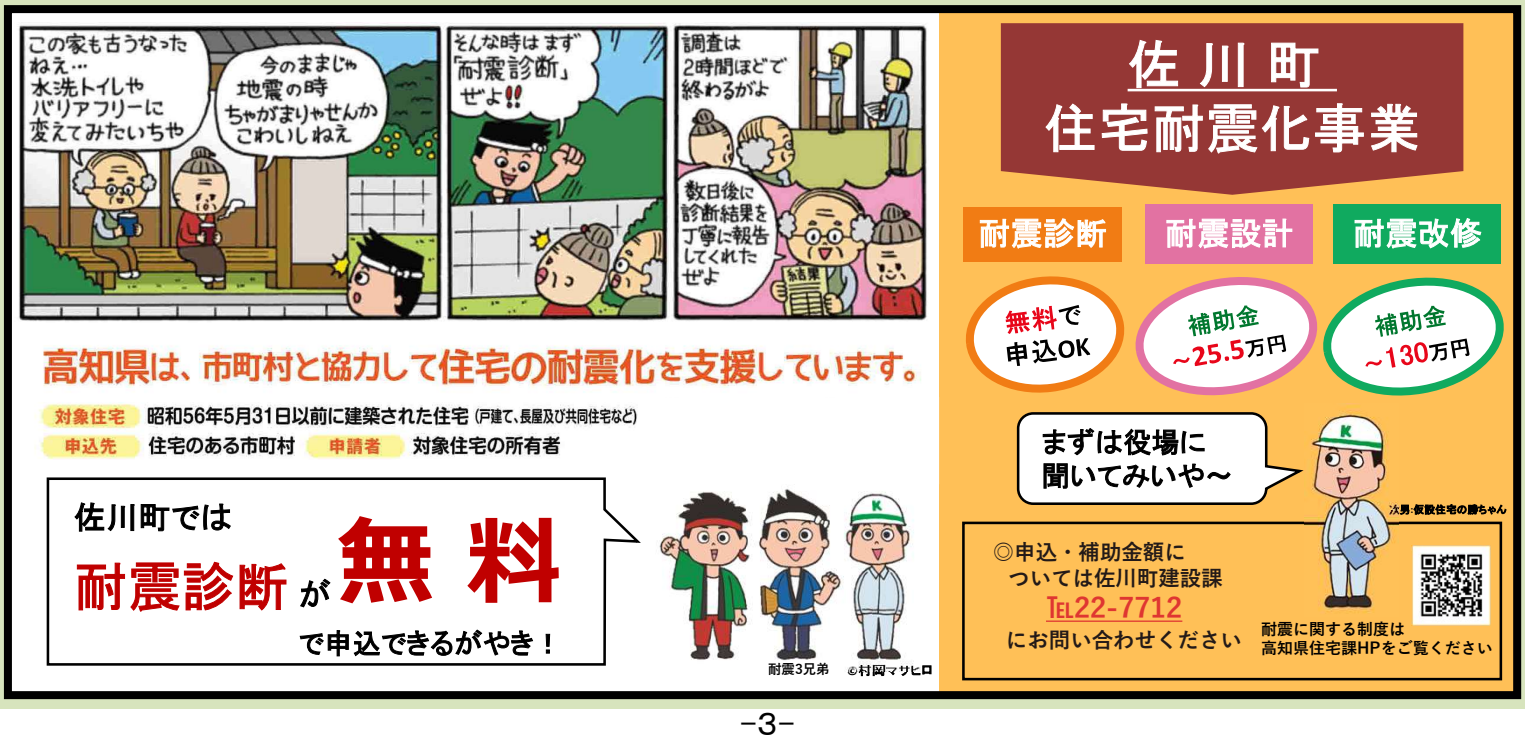

環境モニタリング（令和７年３月測定）の結果について

３月に実施した環境モニタリング（河川水、降下ばいじん）の測定結果をお知らせします。
（降下ばいじんは、２月25日～３月25日の約１か月間の測定結果です。）

１ 河川水

（単位）浮遊物質量：mg/L、濁度：度

地点	測定項目	R7.1.23	R7.2.25	R7.3.25	基準値※1
①	浮遊物質量	1未満	1未満	1未満	25
	濁　度	0.3	0.3	0.3	－
②	浮遊物質量	1未満	1未満	1未満	25
	濁　度	0.3	0.3	0.7	－
③	浮遊物質量	2	2	4	25
	濁　度	2.6	4.6	3.6	－
④	浮遊物質量	1未満	1未満	1未満	25
	濁　度	0.6	0.7	1.1	－

※1　日下川が環境基準類型Aに指定されていることから、類型Aの浮遊物質量の環境基準値を採用。
　なお、濁度については、環境基準値はありませんが、浮遊物質量と相関があることから、あわせて測定しています。

モニタリング地点

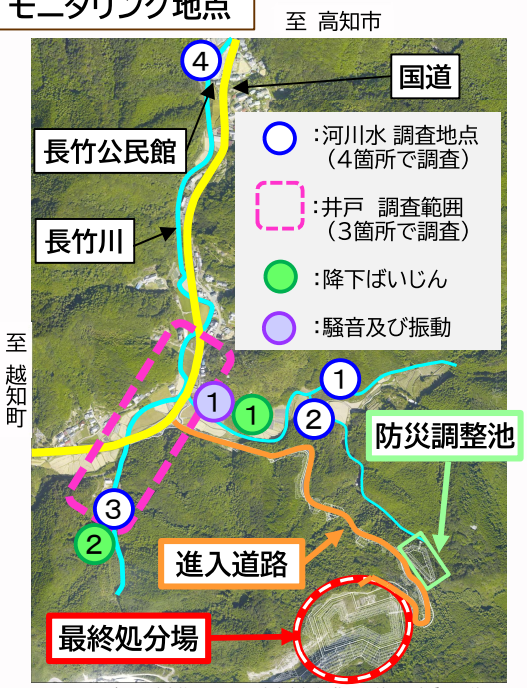

国土交通省四国地方整備局四国山地砂防事務所提供の航空写真データを使用

２ 井戸水

調査は、年４回（季節ごと）実施する計画です。
次の調査は４月下旬の予定です。

３ 降下ばいじん

（単位）t/km²/月

地点	R6.12.25～R7.1.23	R7.1.23～2.25	R7.2.25～3.25	基準値※2
①	0.39	0.73	1.13	10
②※3	0.30	0.62	1.06	10

※2　環境影響評価で定めた参考指標
※3　令和5年4月から測定

環境モニタリングは、計量証明事業所の登録を受けた(株)東洋技研【高知市】が実施しています。

４ 動物(猛禽類)

調査は、４月から８月にかけて実施する計画です。
結果については、期間中の調査結果を取りまとめて、お知らせします。

令和６年の調査で確認された猛禽類（サシバ）

これまでの測定結果及び工事開始前に実施した環境影響評価の測定結果は、以下のいずれかを参照ください。

- これまで配布しております「県・エコサイクル高知からのお知らせ」
- 「公益財団法人エコサイクル高知佐川町事務所」のホームページ
  （URL ：http://www.ecokochi.or.jp/20_sakawa/21_HTML/02_01_sakawa_office_top.html ）

右の二次元コードから「公益財団法人エコサイクル高知佐川町事務所」のホームページをご覧いただけます。
