

～新たな管理型産業廃棄物最終処分場の整備について～

# 県・エコサイクル高知からのお知らせ

## 令和8年度の工事予定について

日頃は新処分場の建設にご協力いただきありがとうございます。令和8年度は以下の工事を予定しております。

**施設本体工事** 令和7年度末における進捗率は41.1%です。

令和8年度 (予定)	埋立地の造成ほか	<ul style="list-style-type: none"> <li>中柱への遮水シートの施工</li> <li>引き続き、処分場建設場所から防災調整池までの進入道路を施工</li> </ul>
	被覆施設	<ul style="list-style-type: none"> <li>屋根を施工するための支保工足場の組立</li> <li>支保工足場組立後、被覆施設本体の施工を開始</li> </ul>
	浸出水処理施設	<ul style="list-style-type: none"> <li>地下躯体の施工後、被覆施設本体の進捗に併せて地上躯体の施工に着手</li> </ul>

**進入道路整備工事** 令和7年度末における進捗率は59.3%です。

令和8年度 (予定)	進入道路	<ul style="list-style-type: none"> <li>引き続き、処分場に向けて、擁壁や水路等を施工し、道路を整備</li> </ul>
---------------	------	---

## 工事区域の現在の状況

### 1 施設本体工事

現在、浸出水処理施設の地下部において、浸出水や上水を溜める水槽の建設工事を進めております。また、施設本体側からの進入路の整備も進めており、併せて擁壁工事も行っています。



水槽の建設状況（令和8年4月3日撮影）



施設本体側の進入路工事の状況（令和8年4月3日撮影）

### 【問合せ先】

○ 公益財団法人エコサイクル高知 佐川町事務所  
 電話：0889-22-4744  
 FAX：0889-22-4764  
 メール：info@ecokochi.or.jp  
 〒789-1201 高岡郡佐川町甲1650番1号

○ 高知県 林業振興・環境部 環境対策課  
 電話：088-821-4595  
 FAX：088-821-4520  
 メール：030801@ken.pref.kochi.lg.jp  
 〒780-8570 高知市丸ノ内1丁目7番52号

## 2 進入道路整備工事

国道33号から500m付近では、谷部（沢）の排水工事を行っています。

また、650m付近からは、施設本体側から進入路が見えるようになってきました。



国道から500m付近



国道から650m付近

## 3 事業のスケジュールおよび総事業費の変更

令和7年6月に発生した埋立地内部南側斜面の変状への追加対策工事により、下記のとおり事業スケジュールに変更が必要となりました。なお、対策の詳細については「お知らせ Vol.41（令和7年12月号）」をご覧ください。

【完成時期】：令和9年8月頃⇒令和10年2月末頃

【供用開始時期】：令和9年9月頃⇒令和10年4月頃

### 完成時期等の見込み

工事の内容		R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	完成 (供用開始 令和10年4月頃)
1 施設本体	埋立地の造成ほか	造成工事			斜面对策工や支保工 下部埋戻撤去		管理棟の建設	
	集水ピット 遮水シート等の設置			集水ピット工事			遮水シート等設置	
	被覆施設	建築材料の製作			建築工事			
	浸出水処理施設	基本設計・詳細設計		基礎工事	建設工事			
2 進入道路	国道及び処分場の両側から整備（上水道工事を含む）							
3 現行施設	受入可能な期間							

多少延命化できる可能性があるが、空白期間が生じる見込み

### 現行施設への対応について

日高村にある「エコサイクルセンター」は、令和9年9月頃に満杯となる見込みです。新処分場の供用開始時期が令和10年4月頃となることから、廃棄物の受入に空白期間が生じます。現在、排出事業者の皆様には、供用開始まで廃棄物の置き置きや、県外排出等へのご協力をお願いしております。

## 総事業費及び財源の見込み

総事業費は、約132.7億円から**約135.1億円**に増額となりました。

### 総事業費：135.1億円（2.4億円増）

総事業費 135.1億円 (令和8年4月時点)	7.2	58.15	38.77	19.38	11.6
凡例：財源内訳 ■ 財団・民間負担金 ■ 県負担金 ■ 高知市負担金 ■ 市町村負担金 ■ 国費					

#### 【総事業費 2.4億円増の内訳】

- ・埋立地内南側斜面の追加安全対策に伴う費用の増 0.7億円
- ・工期延長に伴う費用の増（資材保管費 1億円、監理委託費 0.5億円、その他 0.2億円） 1.7億円

## 環境保全等連絡協議会を開催しました

3月22日（日）に、第9回環境保全等連絡協議会を集落活動センター「加茂の里」で開催しました。会議では、エコサイクル高知から説明を行った後、参加者の皆様と意見交換を行いました

### エコサイクル高知の説明内容

- ・工事の進捗状況及び令和8年度の工事予定について
- ・工事中の環境モニタリングの結果について
- ・加茂中学校による環境学習について
- ・環境保全協定書に基づく活動へのご意見について など



環境保全等連絡協議会の様子

### 主なご意見及び回答

#### <施設工事について>

Q：工期延期が続いているが、崩土が発生するかは施工するまで分からないのか？

A：そのとおりです。

Q：開業の遅れにより廃棄物の受入に半年の空白期間が生じるとのことだが、施設供用開始直後は一時的に搬入が増加するのではないのか？

A：空白期間については、搬出事業者への県外搬出の交渉を行っておりますが、自社で廃棄物を取り置きする場合もあるため、供用開始直後は多少搬入車両が増えることも考えられます。

Q：環境モニタリングの降下ばいじんについて、数値が増加する時期はあるのか？

A：毎年3～4月頃は花粉や黄砂の影響もあり、数値が増加する場合があります。

#### <供用開始後について>

Q：廃棄物の搬入（受入）による朝夕の交通への影響はあるのか？

A：通勤通学のラッシュに影響が出ないよう、搬入時間は9時～16時を予定しています。

Q：長竹川で稚魚の放流をする予定はないのか？

A：【佐川町住民課から回答】生育状況含めて生態系を観察するなど、長竹川に合った活動があるか検討します。

供用開始に向け、引き続き環境保全対策や交通安全対策を行うとともに、しっかりと安全性を確保した施設整備に努めてまいりますので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

# 環境モニタリング（令和8年3月測定）の結果について

3月に実施した環境モニタリング（河川水、降下ばいじん）の測定結果がまとまりましたのでお知らせします。（降下ばいじんは、2月20日～3月24日の約1か月間の測定結果です。）

## 1 河川水

（単位）浮遊物質質量：mg/L、濁度：度

地点	測定項目	R8.1.27	R8.2.20	R8.3.24	基準値※1
①	浮遊物質質量	1未満	1未満	1未満	25
	濁度	0.3	0.4	0.4	—
②	浮遊物質質量	1未満	1未満	1	25
	濁度	0.6	0.7	1.0	—
③	浮遊物質質量	2	2	13	25
	濁度	3.2	4.3	8.5	—
④	浮遊物質質量	1未満	1未満	4	25
	濁度	0.6	1.5	3.7	—


※1 日下川が環境基準類型Aに指定されていることから、類型Aの浮遊物質質量の環境基準値を採用。なお、濁度については、環境基準値はありませんが、浮遊物質質量と相関があることから、あわせて測定しています。

すべての地点で基準値（25mg/L）を下回っていましたが、③の地点ではやや高い数値となっております。

これは、降雨がない日が続いたあと、採取日前に降雨があったため、浮遊物の量が一時的に増えたものと推測されます。今後も引き続き、沈砂池や濁水処理施設による濁水対策を実施してまいります

## モニタリング地点

至高知市

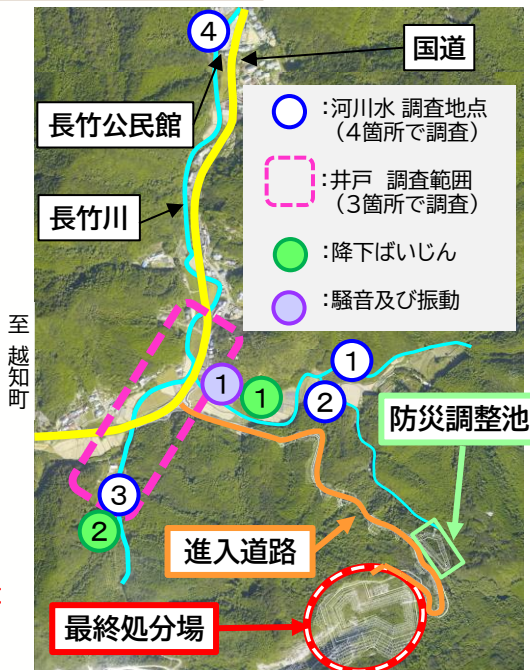

国土交通省四国地方整備局四国山地砂防事務所提供の航空写真データを使用

## 2 井戸水

調査は、年4回（季節ごと）実施する計画です。  
次の調査は4月下旬の予定です。



## 3 降下ばいじん

地点	R7.12.19 ～R8.1.27	R8.1.27 ～2.20	R8.2.20 ～3.24	基準値※2
①	0.46	0.47	0.39	10
②※3	0.82	0.67	0.83	10

※2 環境影響評価で定めた参考指標 （単位）t/km<sup>2</sup>/月

※3 令和5年4月から測定

環境モニタリングは、計量証明事業所の登録を受けた(株)東洋技研【高知市】が実施しています。

## 4 動物(猛禽類)

調査は、4月から8月にかけて実施する計画です。  
結果については、期間中の調査結果を取りまとめてお知らせします。

これまでの測定結果及び工事開始前に実施した環境影響評価の測定結果は、以下のいずれかを参照ください。

- ◆ これまで配布しております「県・エコサイクル高知からのお知らせ」
- ◆ 「公益財団法人エコサイクル高知佐川町事務所」のホームページ  
(URL : [https://www.ecokochi.or.jp/20\\_sakawa/21\\_HTML/02\\_01\\_sakawa\\_office\\_top.html](https://www.ecokochi.or.jp/20_sakawa/21_HTML/02_01_sakawa_office_top.html))

右の二次元コードから「公益財団法人エコサイクル高知佐川町事務所」のホームページをご覧ください。

